



llis

REDACCIÓ, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE PER A COBRIR UNA PISTA POLIESPORTIVA, CONSTRUCCIÓ D'UN BAR, MAGATZEM, ESCENARI I VESTIDORS A RIUDARENES
Codi de l'expedient: **X2026000410**

SOLICITUD D'AMPLIACIÓ DE TERMINI

Data de la sol·licitud: 02 de juliol de 2026


1. DADES DEL PROJECTE I DEL CONTRACTE

- **Projecte:** Redacció, Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut del Projecte per a cobrir una pista poliesportiva, construcció d'un bar, magatzem, escenari i vestidors a Riudarenes.
- **Expedient:** X2026000410
- **Promotor:** Ajuntament de Riudarenes
 - o Plaça de la Vila, 8 17421 Riudarenes
- **Tècnic redactor:** Hernan Lleida Ruiz
 - o Carrer Nou de la Rambla, 140, 08004 Barcelona

2. EXPOSICIÓ DE FETS

1. El contracte signat entre Promotor i Tècnic establia com a data inicial d'arrancada del termini el dia 7 de maig de 2026 i atorgava un termini de 2 mesos i mig. El dia 5 de maig de 2026 el Tècnic va emetre un informe sol·licitant la paralització del termini de redacció fins que es convoques una reunió inicial de seguiment en l'ajuntaemnt on es donés resposta a diversos dubtes tècnics.
2. Durant la reunió inicial d'execució del contracte i tal com recull l'acta d'aquesta el Promotor va demanar al Tècnic redactor diverses modificacions sobre els estudis previs. També va indicar que estudiaria l'encaix contractual i administratiu d'aquests canvis.

Distribució segons Estudis Previs:

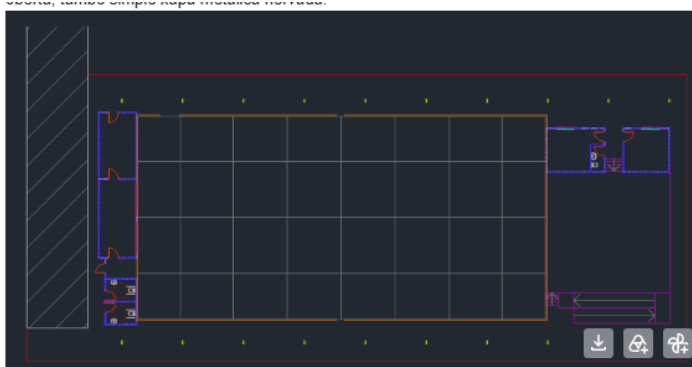


Proposta de distribució modificada:



llis

REDACCIÓ, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE PER A COBRIR UNA PISTA POLIESPORTIVA, CONSTRUCCIÓ D'UN BAR, MAGATZEM, ESCENARI I VESTIDORS A RIUDARENES

Codi de l'expedient: **X2026000410**

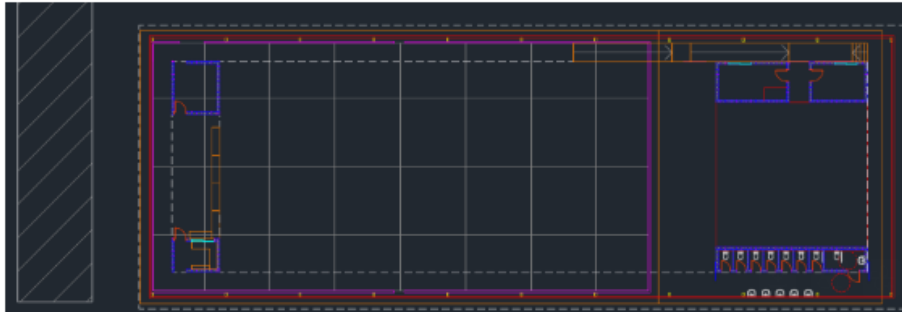

3. Un cop estudiat, el promotor indica al tècnic redactor mitjançant correu electrònic enviat en data 02 de juliol de 2026 que es descarta realitzar cap modificació sobre els estudis previs degut al difícil encaix administratiu d'aquestes modificacions i probables dificultats que això ocasionaria en l'obtenció de la subvenció que possibilita l'actuació.
4. Considerant la notificació de manca d'informació i que aquesta no ha sigut aportada fins a data de 02 de juliol de 2026 s'exposa que cal considerar el termini com a suspès fins al moment actual on s'ha donat resposta efectiva a les qüestions tècniques inicials plantejades.

3. SOL·LICITUDS

1. Que s'accepti la notificació inicial de suspensió de termini i es consideri que no s'hi ha donat resposta efectiva fins a data de 02 de juliol de 2026.
2. Que s'estableixi com a nova data d'inici de redacció el dia 02 de juliol de 2026 i per conseqüent es fixi com a nova data d'entrega el dia 15 de setembre de 2026.

El Tècnic Redactor
